

GESTIÓN DEL PROYECTO CultuVivo

Integrantes del equipo de trabajo con roles

- ❖ Scrum master: Luis Hernán González Ordoñez
- ❖ miembros del equipo #1: Brayan Espinosa Osorio
- ❖ miembro del equipo #2: Shirly Katherinn Leal Nieves
- ❖ miembro del equipo #3: Andrés Santiago Gómez Rojas

1. BACKLOG - Historias identificadas

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
HU-01	Como administrador , quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	△ Alta	El sistema permite registrar nombre, fecha, hora, lugar, capacidad máxima y descripción del evento. Los cambios se guardan correctamente y se actualizan en la vista pública.
HU-02	Como administrador , quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	△ Alta	El sistema permite vincular artistas a eventos existentes, especificando tipo de presentación y duración.
HU-03	Como administrador , quiero gestionar la capacidad de los eventos para evitar superar el aforo permitido.	△ Alta	Cuando la capacidad máxima se alcanza, el sistema bloquea nuevos registros y muestra un mensaje de "Evento completo".
HU-04	Como asistente , quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	△ Alta	El sistema muestra un listado actualizado de eventos con fecha, lugar y estado (cupos disponibles / completo).
HU-05	Como asistente , quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	△ Alta	Se solicitan datos personales (identificación, nombre, correo, tipo de boleto) y se guarda el estado "Confirmado" o "En espera" según disponibilidad.
HU-06	Como asistente , quiero cancelar o modificar mi asistencia para liberar mi cupo si no puedo asistir.	◇ Media	El sistema actualiza el estado del registro a "Cancelado" y permite reasignar el cupo automáticamente.
HU-07	Como artista , quiero ver mi agenda de presentaciones para organizar mis horarios.	△ Alta	El sistema lista los eventos en los que participo, mostrando fecha, hora, lugar y duración de la actuación.

HU-08	Como administrador , quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	△ Alta	Se almacena nombre, tipo de presentación, duración y contacto. Se pueden editar y eliminar registros.
HU-09	Como administrador , quiero ver el listado de asistentes de cada evento para controlar el acceso.	◇ Media	El sistema genera una tabla con los datos de asistentes y su estado (confirmado, en espera, cancelado).
HU-10	Como administrador , quiero generar reportes de eventos próximos para planificar la logística.	◇ Media	Se muestra una lista de eventos con fechas futuras, aforo ocupado y número de artistas asignados.
HU-11	Como administrador , quiero generar reportes de artistas por evento para validar la programación.	◇ Baja	Se listan artistas con sus respectivas actuaciones y duraciones por cada evento.
HU-12	Como administrador , quiero generar reportes de asistencia para evaluar el éxito de los eventos.	◇ Baja	El sistema muestra estadísticas de asistentes confirmados, cancelados y en espera.
HU-13	Como administrador , quiero identificar eventos con baja asistencia para tomar decisiones estratégicas.	◇ Baja	El sistema resalta eventos con ocupación menor al 50 % de la capacidad.
HU-14	Como usuario (asistente o artista) , quiero iniciar sesión o registrarme en la plataforma para acceder a mis funciones.	△ Alta	El sistema valida credenciales y muestra el panel correspondiente según el rol.
HU-15	Como administrador , quiero gestionar los roles de usuario para controlar los accesos al sistema.	△ Alta	El sistema permite asignar roles (Administrador, Artista, Asistente) y restringe funciones según permisos.

2. SPRINT #1 - Historias de usuario

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
HU-01	Como administrador , quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	△ Alta	El sistema permite registrar nombre, fecha, hora, lugar, capacidad máxima y descripción del evento. Los cambios se guardan correctamente y se actualizan en la vista pública.

HU-02	Como administrador , quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	△ Alta	El sistema permite vincular artistas a eventos existentes, especificando tipo de presentación y duración.
HU-04	Como asistente , quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	△ Alta	El sistema muestra un listado actualizado de eventos con fecha, lugar y estado (cupos disponibles / completo).
HU-05	Como asistente , quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	△ Alta	Se solicitan datos personales (identificación, nombre, correo, tipo de boleto) y se guarda el estado “Confirmado” o “En espera” según disponibilidad.
HU-08	Como administrador , quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	△ Alta	Se almacena nombre, tipo de presentación, duración y contacto. Se pueden editar y eliminar registros.

3. Documentación de todo el proceso de scrum

a. Planificación del sprint

i. Información General

Proyecto: Sistema de Gestión de Eventos Culturales – CultuVivo

Sprint: Sprint 1

Duración: 5 días (22 al 27 de octubre de 2025)

Scrum Master: Luis Hernán González Ordoñez

Product Owner: Carlos Rueda

Equipo de Desarrollo:

- Andrés Santiago Gómez Rojas
- Shirley Katherinn Leal Nieves
- Brayan Espinosa Osorio

ii. Objetivo del Sprint

Desarrollar un MVP funcional que permita gestionar eventos culturales, incluyendo la creación y administración de eventos, el registro de artistas y asistentes, la asignación de artistas a eventos y el control de capacidad, garantizando el acceso por roles.

iii. Historias de usuario seleccionadas

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Dependencias
HU-01	Crear, editar y eliminar eventos	Alta	-
HU-08	Registrar y administrar artistas	Alta	-
HU-02	Asignar artistas a eventos	Alta	HU-08
HU-04	Ver lista de eventos disponibles	Media	HU-01

HU-05	Registrar asistentes a eventos	Alta	HU-01
-------	--------------------------------	------	-------

iv. Sprint Backlog resumido

Día	Actividad Principal	Historias Relacionadas	Responsable	Entregable
Día 1	Diseño de base de datos y planificación técnica	HU-01, HU-08	Brayan Espinosa Osorio	Estructura lista
Día 2	CRUD de eventos y artistas	HU-01, HU-08	Brayan Espinosa Osorio	Módulos funcionales
Día 3	Asignación de artistas y vista de eventos	HU-02, HU-04	Brayan Espinosa Osorio	Interfaces conectadas
			Santiago Gomez	
Día 4	Registro de asistentes	HU-05	Shirly Leal	Autenticación operativa
Día 5	Pruebas integrales y demo final	Todas	Equipo	MVP funcional

v. Criterios de aceptación globales

- Permitir crear, editar y eliminar eventos.
- Registrar artistas y asignarlos correctamente a eventos.
- Registrar asistentes respetando la capacidad máxima.
- Validar y probar cada módulo sin errores críticos.

vi. Riesgos y Acciones Preventivas

Riesgo	Impacto	Acción Preventiva
Retraso en configuración del entorno	Medio	Verificar entorno completo antes del inicio del sprint.
Dependencia entre HU-08 y HU-02	Alto	Desarrollar HU-08 antes y probar integración temprana.
Sobrecarga del equipo	Bajo	Distribuir tareas según especialidad.

vii. Ceremonias Programadas

Ceremonia	Día	Hora	Participantes
Sprint Planning	Día 1	7:00 p.m.	Todo el equipo
Daily Stand-up	Día 1–5	7:00 p.m.	Todo el equipo
Sprint Review	Día 5	7:00 p.m.	Todo el equipo
Sprint Retrospective	Día 5	8:30 a.m.	Todo el equipo


b. Avance del sprint

i. Día 1

Gestión de proyecto con Scrum

Esta plantilla contiene tres bases de datos conectadas para ayudarte a realizar la gestión de un proyecto ágil bajo en marco de trabajo Scrum. Esta plantilla utiliza configuraciones y automatizaciones de bases de datos. Te recomiendo ver el tutorial antes de empezar a usarlo.

► ¿Cómo usar esta plantilla? [Despliega esto para ver video de explicación]

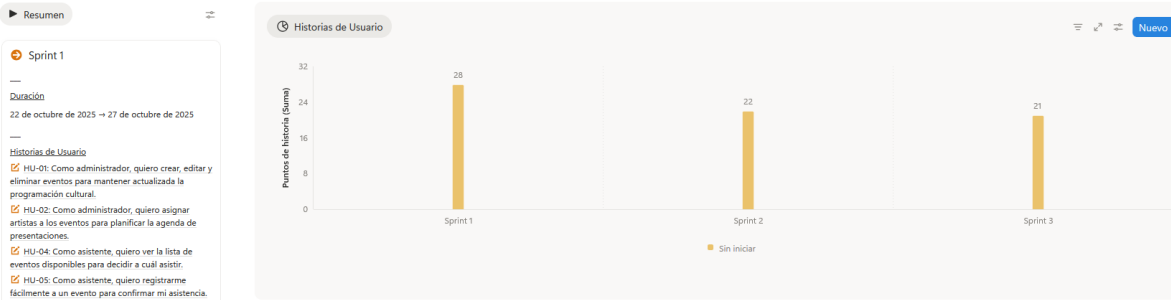

Sprints

Todos Gantt Tablero

Estado Aa Nombre Duración Historias de Usuario Finalizar sprint + ...

Sin iniciar	Sprint 3	3 de noviembre de 2025 → 8 de noviembre de 2025	✓ HU-06: Como asistente, quiero cancelar o	Finalizar sprint	
Sin iniciar	Sprint 2	28 de octubre de 2025 → 2 de noviembre de 2025	✓ HU-03: Como administrador, quiero gesti	Finalizar sprint	
En proceso	Sprint 1	22 de octubre de 2025 → 27 de octubre de 2025	✓ HU-01: Como administrador, quiero crear	Finalizar sprint	

+ Nueva página

RECuento 3

Backlog

Sprint Backlog

HU por sprints

HU por épicas

Todas las HU

Sin iniciar

Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+ ...
✓	HU-08: Como administrador, quiero reg	Como administrador, quiero re	8	Gestión de ...	➡ Sprint 1	Sin iniciar		
✓	HU-05: Como asistente, quiero registrar	Como asistente, quiero registra	5	Gestión de ...	➡ Sprint 1	Sin iniciar		
✓	HU-04: Como asistente, quiero ver la lis	Como asistente, quiero ver la lis	2	Gestión de ...	➡ Sprint 1	Sin iniciar		
✓	HU-01: Como administrador, quiero cre	Como administrador, quiero cre	8	Gestión de ...	➡ Sprint 1	Sin iniciar		
✓	HU-02: Como administrador, quiero asi	Como administrador, quiero as	5	Gestión de ...	➡ Sprint 1	Sin iniciar		

+ Nueva página

En curso

Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+ ...
Editar filtros + Añadir página								

Terminado

Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+ ...
Editar filtros + Añadir página								

Backlog

Sprint Backlog

HU por sprints

HU por épicas

Todas las HU

Sprint 128

✓ HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.

✓ HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.

✓ HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.

✓ HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.

✓ HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.

+ Nueva página

Sprint 222

✓ HU-15: Como administrador, quiero gestionar los roles de usuario para controlar los accesos al sistema.

✓ HU-14: Como usuario (asistente o artista), quiero iniciar sesión o registrarme en la plataforma para acceder a mis funciones.

✓ HU-07: Como artista, quiero ver mi agenda de presentaciones para organizar mis horarios.

✓ HU-03: Como administrador, quiero gestionar la capacidad de los eventos para evitar superar el aforo permitido.

+ Nueva página

Sprint 321

✓ HU-13: Como administrador, quiero identificar eventos con baja asistencia para tomar decisiones estratégicas.

✓ HU-12: Como administrador, quiero generar reportes de asistencia para evaluar el éxito de los eventos.

✓ HU-11: Como administrador, quiero generar reportes de artistas por evento para validar la programación.

✓ HU-10: Como administrador, quiero generar reportes de eventos próximos para planificar la logística.

✓ HU-09: Como administrador, quiero ver el listado de asistentes de cada evento para controlar el acceso.

✓ HU-06: Como asistente, quiero cancelar o modificar mi asistencia para liberar mi cupo si no puedo asistir.

+ Nueva página

Backlog

Sprint Backlog

HU por sprints

HU por épicas

Todas las HU

Gestión de Eventos Cultur...

✓ HU-13: Como administrador, quiero identificar eventos con baja asistencia para tomar decisiones estratégicas.

✓ HU-10: Como administrador, quiero generar reportes de eventos próximos para planificar la logística.

✓ HU-03: Como administrador, quiero gestionar la capacidad de los eventos para evitar superar el aforo permitido.

✓ HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.

+ Nueva página

Gestión de Artistas y Pres...

✓ HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.

✓ HU-11: Como administrador, quiero generar reportes de artistas por evento para validar la programación.

✓ HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.

✓ HU-07: Como artista, quiero ver mi agenda de presentaciones para organizar mis horarios.

+ Nueva página

Gestión de Asistentes y R...

✓ HU-12: Como administrador, quiero generar reportes de asistencia para evaluar el éxito de los eventos.

✓ HU-09: Como administrador, quiero ver el listado de asistentes de cada evento para controlar el acceso.

✓ HU-06: Como asistente, quiero cancelar o modificar mi asistencia para liberar mi cupo si no puedo asistir.

✓ HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.

✓ HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.

+ Nueva página

Control de Accesos y Roles

✓ HU-15: Como administrador, quiero gestionar los roles de usuario para controlar los accesos al sistema.

✓ HU-14: Como usuario (asistente o artista), quiero iniciar sesión o registrarme en la plataforma para acceder a mis funciones.

+ Nueva página

Backlog

Sprint Backlog

HU por sprints

HU por épicas

Todas las HU

Sin iniciar

Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de h...	🕒 Épica	🚩 Sprint	⚙ Estado	🏆 Prioridad
🔗	HU-01: Como administrador, quiero cre	Como administrador, quiero cre		8	Gestión de ...	🚩 Sprint 1	Sin iniciar	Alta
🔗	HU-02: Como administrador, quiero asi	Como administrador, quiero as		5	Gestión de ...	🚩 Sprint 1	Sin iniciar	Alta
🔗	HU-03: Como administrador, quiero ges	Como administrador, quiero ge		3	Gestión de ...	🚩 Sprint 2	Sin iniciar	Alta
🔗	HU-04: Como asistente, quiero ver la lis	Como asistente, quiero ver la lis		2	Gestión de ...	🚩 Sprint 1	Sin iniciar	Alta
🔗	HU-05: Como asistente, quiero registrar	Como asistente, quiero registra		5	Gestión de ...	🚩 Sprint 1	Sin iniciar	Alta
🔗	HU-06: Como asistente, quiero cancelar	Como asistente, quiero cancela		3	Gestión de ...	🚩 Sprint 3	Sin iniciar	Media
🔗	HU-07: Como artista, quiero ver mi age	Como artista, quiero ver mi age		3	Gestión de ...	🚩 Sprint 2	Sin iniciar	Alta
🔗	HU-08: Como administrador, quiero reg	Como administrador, quiero re		8	Gestión de ...	🚩 Sprint 1	Sin iniciar	Alta
🔗	HU-09: Como administrador, quiero ver	Como administrador, quiero ve		3	Gestión de ...	🚩 Sprint 3	Sin iniciar	Media
🔗	HU-10: Como administrador, quiero ger	Como administrador, quiero ge		5	Gestión de ...	🚩 Sprint 3	Sin iniciar	Media
🔗	HU-11: Como administrador, quiero ger	Como administrador, quiero ge		3	Gestión de ...	🚩 Sprint 3	Sin iniciar	Baja
☐	HU-12: Como administrador, quiero ger	Como administrador, quiero ge		5	Gestión de ...	🚩 Sprint 3	Sin iniciar	Baja
🔗	HU-13: Como administrador, quiero ide	Como administrador, quiero ide		2	Gestión de ...	🚩 Sprint 3	Sin iniciar	Baja
🔗	HU-14: Como usuario (asistente o artist	Como usuario (asistente o artis		8	Control de ...	🚩 Sprint 2	Sin iniciar	Alta
🔗	HU-15: Como administrador, quiero ges	Como administrador, quiero ge		8	Control de ...	🚩 Sprint 2	Sin iniciar	Alta

+ Nueva página

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual

Tabla

Todas las tareas

Aa	Nombre	⚙ Estado	👤 Responsable	📅 Deadline	🚩 Historia de usuario	🔍 Sprint
🔗	Desarrollo del módulo de gestión de eventos culturales	Pendiente	B Brayan Espinosa Osorio L Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	🔗 HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	🚩 Sprint 1
🔗	Implementación del módulo de asignación de artistas a eventos	Pendiente	B Brayan Espinosa Osorio L Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	🔗 HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	🚩 Sprint 1
🔗	Desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles	Pendiente	S santiago gomez	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	🔗 HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	🚩 Sprint 1
🔗	Implementación del sistema de registro de asistentes a eventos	Pendiente	S shirlyk leal	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	🔗 HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	🚩 Sprint 1
🔗	Desarrollo del módulo de administración de artistas	Pendiente	L Luis Hernan Gonzalez Or B Brayan Espinosa Osorio	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	🔗 HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	🚩 Sprint 1

+ Nueva página

ii. Día 2

Gestión de proyecto con Scrum

 Esta plantilla contiene tres bases de datos conectadas para ayudarte a realizar la gestión de un proyecto ágil bajo en marco de trabajo Scrum. Esta plantilla utiliza configuraciones y automatizaciones de bases recomendando ver el tutorial antes de empezar a usarlo.

[▶ ¿Cómo usar esta plantilla?](#) [Despliega esto para ver video de explicación]

► Resumen

Sprint 1

Duración

22 de octubre de 2025 → 27 de octubre de 2025

Historias de Usuario

🔖 HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.

🔖 HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.


🔖 HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.

🔖 HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.

🔖 HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.

Finalizar sprint

Historias de Usuario

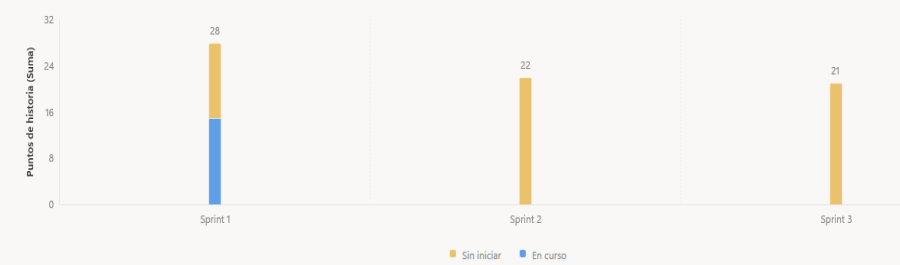

Sprint	En curso	Sin iniciar	Total
Sprint 1	16	12	28
Sprint 2	0	22	22
Sprint 3	0	21	21

Escribe, pulsa «Espacio» para la IA o escribe «/» para mostrar los comandos...

Backlog

Sprint Backlog

HU por sprints

HU por épicas

Todas las HU

Sin iniciar

Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	🕒 Épica	🏁 Sprint	⚙ Estado	+ ...
🔖	HU-08: Como administrador, quiero reg	Como administrador, quiero re		8	Gestión de ...	🏁 Sprint 1	Sin iniciar	
🔖	HU-02: Como administrador, quiero as	Como administrador, quiero as		5	Gestión de ...	🏁 Sprint 1	Sin iniciar	

+ Nueva página

En curso

Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	🕒 Épica	🏁 Sprint	⚙ Estado	+ ...
🔖	HU-05: Como asistente, quiero registrar	Como asistente, quiero registra		5	Gestión de ...	🏁 Sprint 1	En curso	
🔖	HU-04: Como asistente, quiero ver la lis	Como asistente, quiero ver la li		2	Gestión de ...	🏁 Sprint 1	En curso	
🔖	HU-01: Como administrador, quiero cre	Como administrador, quiero cre		8	Gestión de ...	🏁 Sprint 1	En curso	

+ Nueva página

Terminado

Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	🕒 Épica	🏁 Sprint	⚙ Estado	+ ...
----	--------	---------------	---	---------------	---------	----------	----------	-------

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual Tabla Todas las tareas

Nombre	Estado	Responsable	Deadline	Historia de usuario	Sprint
Desarrollo del módulo de gestión de eventos culturales	En proceso	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	Sprint 1
Implementación del módulo de asignación de artistas a eventos	Pendiente	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	Sprint 1
Desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles	En proceso	santiago gomez	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	Sprint 1
Implementación del sistema de registro de asistentes a eventos	En proceso	shirlyk leal	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	Sprint 1
Desarrollo del módulo de administración de artistas	Pendiente	Luis Hernan Gonzalez Or Brayan Espinosa Osorio	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	Sprint 1

iii. Día 3

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual Tabla Todas las tareas

Nombre	Estado	Responsable	Deadline	Historia de usuario	Sprint
Desarrollo del módulo de gestión de eventos culturales	Por validar	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	Sprint 1
Implementación del módulo de asignación de artistas a eventos	Pendiente	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	Sprint 1
Desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles	En proceso	santiago gomez	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	Sprint 1
Implementación del sistema de registro de asistentes a eventos	En proceso	shirlyk leal	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	Sprint 1
Desarrollo del módulo de administración de artistas	Pendiente	Luis Hernan Gonzalez Or Brayan Espinosa Osorio	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	Sprint 1

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual Tabla Todas las tareas

Aa Nombre	Estado	Responsable	Deadline	Historia de usuario	Sprint
Desarrollo del módulo de gestión de eventos culturales	Por validar	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	Sprint 1
Implementación del módulo de asignación de artistas a eventos	Pendiente	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	Sprint 1
Desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles	En proceso	santiago gomez	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	Sprint 1
Implementación del sistema de registro de asistentes a eventos	En proceso	shirlyk leal	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	Sprint 1
Desarrollo del módulo de administración de artistas	En proceso	Luis Hernan Gonzalez Or Brayan Espinosa Osorio	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	Sprint 1

Backlog

Sprint Backlog HU por sprints HU por épicas Todas las HU

Sin iniciar

Aa Nombre	Descripción ⓘ	# Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+	...
HU-02: Como administrador, quiero as	Como administrador, quiero as	5	Gestión de ...	Sprint 1	Sin iniciar		

+ Nueva página

En curso

Aa Nombre	Descripción ⓘ	# Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+	...
HU-08: Como administrador, quiero reg	Como administrador, quiero reg	8	Gestión de ...	Sprint 1	En curso		
HU-05: Como asistente, quiero registrar	Como asistente, quiero registra	5	Gestión de ...	Sprint 1	En curso		
HU-04: Como asistente, quiero ver la lis	Como asistente, quiero ver la lis	2	Gestión de ...	Sprint 1	En curso		
HU-01: Como administrador, quiero cre	Como administrador, quiero cre	8	Gestión de ...	Sprint 1	En curso		

+ Nueva página

Terminado

Aa Nombre	Descripción ⓘ	# Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+	...
-----------	---------------	-----------------	-------	--------	--------	---	-----

Editar filtros

+ Añadir página

Gestión de proyecto con Scrum

Esta plantilla contiene tres bases de datos conectadas para ayudarte a realizar la gestión de un proyecto ágil bajo en marco de trabajo **Scrum**. Esta plantilla utiliza configuraciones y automatizaciones de bases de datos recomendando ver el tutorial antes de empezar a usarlo.

▶ ¿Cómo usar esta plantilla? [Despliega esto para ver video de explicación]



iv. Día 4

Backlog

Sprint Backlog

HU por sprints

HU por épicas

Todas las HU

Sin iniciar

Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+	...
Editar filtros Añadir página									
En curso									
Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+	...
✓	HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	8	Gestión de ...	→	Sprint 1	En curso		
✓	HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	5	Gestión de ...	→	Sprint 1	En curso		
✓	HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	2	Gestión de ...	→	Sprint 1	En curso		
✓	HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	5	Gestión de ...	→	Sprint 1	En curso		
Nueva página									
Terminado									
Aa	Nombre	Descripción ⓘ	#	Puntos de ...	Épica	Sprint	Estado	+	...
✓	HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	8	Gestión de ...	→	Sprint 1	Terminado		
Nueva página									

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual Tabla Todas las tareas

Aa Nombre	Estado	Responsable	Deadline	Historia de usuario	Sprint
Desarrollo del módulo de gestión de eventos culturales	Terminado	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	Sprint 1
Implementación del módulo de asignación de artistas a eventos	En proceso	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	Sprint 1
Desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles	Por validar	santiago gomez	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	Sprint 1
Implementación del sistema de registro de asistentes a eventos	Por validar	shirlyk leal	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	Sprint 1
Desarrollo del módulo de administración de artistas	Por validar	Luis Hernan Gonzalez Or Brayan Espinosa Osorio	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	Sprint 1

+ Nueva página

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual Tabla Todas las tareas

Aa Nombre	Estado	Responsable	Deadline	Historia de usuario	Sprint
Desarrollo del módulo de gestión de eventos culturales	Terminado	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	Sprint 1
Implementación del módulo de asignación de artistas a eventos	Por validar	Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	Sprint 1
Desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles	Por validar	santiago gomez	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	Sprint 1
Implementación del sistema de registro de asistentes a eventos	Por validar	shirlyk leal	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	Sprint 1
Desarrollo del módulo de administración de artistas	Por validar	Luis Hernan Gonzalez Or Brayan Espinosa Osorio	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	Sprint 1

Gestión de proyecto con Scrum

Esta plantilla contiene tres bases de datos conectadas para ayudarte a realizar la gestión de un proyecto ágil bajo en marco de trabajo **Scrum**. Esta plantilla utiliza configuraciones y automatizaciones de base: recomiendo ver el tutorial antes de empezar a usarlo.

► **¿Cómo usar esta plantilla?** [Despliega esto para ver video de explicación]



v. Día 5

Tareas de Historias de Usuario

Tareas del Sprint Actual Tabla Todas las tareas

Aa Nombre	Estado	Responsable	Deadline	Historia de usuario	Sprint
✎ Desarrollo del módulo de gestión de eventos culturales	Terminado	B Brayan Espinosa Osorio L Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	✓ HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural.	➡ Sprint 1
✎ Implementación del módulo de asignación de artistas a eventos	Terminado	B Brayan Espinosa Osorio L Luis Hernan Gonzalez Or	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	✓ HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones.	➡ Sprint 1
✎ Desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles	Terminado	8 santiago gomez	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	✓ HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir.	➡ Sprint 1
✎ Implementación del sistema de registro de asistentes a eventos	Terminado	5 shirlyk leal	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	✓ HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia.	➡ Sprint 1
✎ Desarrollo del módulo de administración de artistas	Terminado	L Luis Hernan Gonzalez Or B Brayan Espinosa Osorio	22 de octubre de 2025 → 25 de octubre de 2025	✓ HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos.	➡ Sprint 1

+ Nueva página

Backlog

Sprint Backlog

HU por sprints

HU por épicas

Todas las HU

Sin iniciar

Aa

Nombre

Descripción

#

Puntos de ...

Épica

Sprint

Estado

+

...

Editar filtros

Añadir página

En curso

Aa

Nombre

Descripción

#

Puntos de ...

Épica

Sprint

Estado

+

...

Editar filtros

Añadir página

Terminado

Aa

Nombre

Descripción

#

Puntos de ...

Épica

Sprint

Estado

+

...

HU-08: Como administrador, quiero reg

Como administrador, quiero reg

8

Gestión de ...

Sprint 1

Terminado

HU-05: Como asistente, quiero registrar

Como asistente, quiero registra

5

Gestión de ...

Sprint 1

Terminado

HU-04: Como asistente, quiero ver la lis

Como asistente, quiero ver la li

2

Gestión de ...

Sprint 1

Terminado

HU-01: Como administrador, quiero cre

Como administrador, quiero cre

8

Gestión de ...

Sprint 1

Terminado

HU-02: Como administrador, quiero asi

Como administrador, quiero as

5

Gestión de ...

Sprint 1

Terminado

Nueva página

Sprints

Todos

Gantt

Tablero

Estado

Aa

Nombre

Duración

Historias de Usuario

Finalizar sprint

+

...

Sin iniciar

Sprint 3

3 de noviembre de 2025 → 8 de noviembre de 2025

HU-06: Como asistente, quiero cancelar o

Finalizar sprint

Sin iniciar

Sprint 2

28 de octubre de 2025 → 2 de noviembre de 2025

HU-03: Como administrador, quiero gesti

Finalizar sprint

Completado

Sprint 1

22 de octubre de 2025 → 27 de octubre de 2025

HU-01: Como administrador, quiero crear

Finalizar sprint


Nueva página

RECuento 3

Gestión de proyecto con Scrum

Esta plantilla contiene tres bases de datos conectadas para ayudarte a realizar la gestión de un proyecto ágil bajo en marco de trabajo **Scrum**. Esta plantilla utiliza configuraciones y automatizaciones de bases de datos. Te recomiendo ver el tutorial antes de empezar a usarlo.

► [¿Cómo usar esta plantilla?](#) [Despliega esto para ver video de explicación]

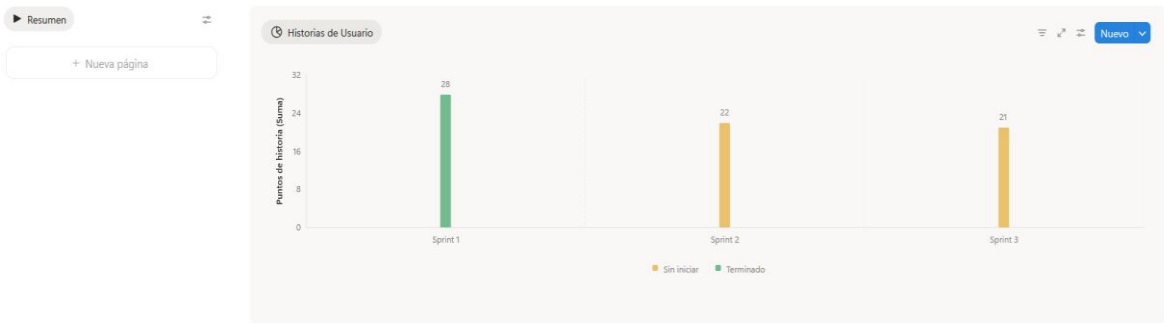

19	20	21	+	22	23	24	25
				✓ Desarrollo del módulo de administración de artistas ✓ HU-08: Como administrador, quiero registrar y administrar artistas para tener actualizada la base de datos. Luis Hernan Gonzalez Ordoñez Brayan Espinosa Osorio Terminado ✓ Implementación del sistema de registro de asistentes a eventos ✓ HU-05: Como asistente, quiero registrarme fácilmente a un evento para confirmar mi asistencia. shirlyk leal Terminado ✓ Desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles ✓ HU-04: Como asistente, quiero ver la lista de eventos disponibles para decidir a cuál asistir. santiago gomez Terminado ✓ Implementación del módulo de asignación de artistas a eventos ✓ HU-02: Como administrador, quiero asignar artistas a los eventos para planificar la agenda de presentaciones. Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Ordoñez Terminado ✓ Desarrollo del módulo de gestión de eventos culturales ✓ HU-01: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar eventos para mantener actualizada la programación cultural. Brayan Espinosa Osorio Luis Hernan Gonzalez Ordoñez Terminado			
26	27	28		29	30	31	1 nov

c. Daily Stand up

i. Día 1

Integrante	Rol	Qué hice ayer	Qué haré hoy	Obstáculos	Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas	Desarrollador	Nada	Definir la estructura del archivo json para persistencia. Inicio el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles.	Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales.	No asigné tareas a desarrollar el día anterior en espera de aprobación del Sprint backlog por PO.
Shirly Katherinn Leal Nieves	Desarrollador	Nada	Definir la estructura del archivo json para persistencia. Iniciar la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos.	Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales.	No asigné tareas a desarrollar el día anterior en espera de aprobación del Sprint backlog por PO.
Brayan Espinosa Osorio	Desarrollador	Nada	Definir la estructura del archivo json para persistencia. Desarrollar el módulo de	Riesgo de errores en el código por entrega acelerada del módulo por su	No asigné tareas a desarrollar el día anterior en espera de aprobación del

			gestión de eventos culturales.	prioridad en el desarrollo.	Sprint backlog por PO.
Luis Hernán González Ordoñez	Scrum Master	Generé el product backlog, el sprint backlog y el repositorio del proyecto.	Generación del acta de sprint planing Generación del formato del Daily Stand up	Poca experticia en desarrollo de esta documentación.	Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.

ii. Día 2

Integrante	Rol	Qué hice ayer	Qué haré hoy	Obstáculos	Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas	Desarrollador	Definí la estructura del archivo json para persistencia. Inicié el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles.	Desarrollaré del listado dinámico de eventos disponibles.	Errores en el uso de un Json único compartido.	Trabajo colaborativo notable.
Shirly Katherinn Leal Nieves	Desarrollador	Definí la estructura del archivo json para persistencia. Inicié la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos.	Implementaré del sistema de registro de asistentes a eventos.	Errores en el uso de un Json único compartido.	Proactividad en la ejecución de las tareas.
Brayan Espinosa Osorio	Desarrollador	Definí la estructura del archivo json para persistencia. Desarrollé el módulo de gestión de	Desarrollaré del módulo de administración de artistas.	Errores en el uso de un Json único compartido.	Liderazgo en el equipo de desarrollo.

		eventos culturales.			
Luis Hernán González Ordoñez	Scrum Master	Generé del acta de sprint planing. Generé del formato del Daily Stand up.	Generaré el Scrum board.	Poca experticia en desarrollo de esta documentación.	Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.

iii. Día 3

Integrante	Rol	Qué hice ayer	Qué haré hoy	Obstáculos	Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas	Desarrollador	Avancé en el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles.	Continuaré en el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles.	Repositorio con conflictos. Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales.	Trabajo colaborativo notable y genera soluciones a los conflictos encontrados.
Shirly Katherinn Leal Nieves	Desarrollador	Avancé en la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos.	Continuaré en la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos.	Repositorio con conflictos. Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales.	Proactividad y constancia en el desarrollo de su tarea asignada.
Brayan Espinosa Osorio	Desarrollador	Desarrollé el módulo de administración de artistas.	Solucionaré los conflictos del módulo de gestión de eventos culturales.	Repositorio con conflictos. Tener que desarrollar de forma acelerada debido a la prioridad de su modulo.	Proactividad, resolución de conflictos y liderazgo del equipo de desarrollo.
Luis Hernán González Ordoñez	Scrum Master	Generé el Scrum board.	Generaré de nuevo el repositorio por errores míos en la generación de las ramas y conflictos en los push de los desarrolladores.	Poca experticia en desarrollo de esta documentación.	Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.

iv. Día 4

Integrante	Rol	Qué hice ayer	Qué haré hoy	Obstáculos	Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas	Desarrollador	Desarrollé del listado dinámico de eventos disponibles.	Validaré el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles.	Repositorio con conflictos. Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales.	Eficacia en el desarrollo de sus tareas.
Shirly Katherinn Leal Nieves	Desarrollador	Implementé el sistema de registro de asistentes a eventos.	Validaré la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos.	Repositorio con conflictos. Dependencia del módulo de gestión de eventos culturales.	Eficacia en el desarrollo de sus tareas.
Brayan Espinosa Osorio	Desarrollador	Solucioné los conflictos del módulo de gestión de eventos culturales.	Implementaré el módulo de asignación de artistas a eventos	Repositorio con conflictos. Tener que desarrollar de forma acelerada debido a la prioridad de su modulo.	Eficiencia notable en el desarrollo de las tareas asignadas
Luis Hernán González Ordoñez	Scrum Master	Generé de nuevo el repositorio por errores míos en la generación de las ramas y conflictos en los push de los desarrolladores.	Generaré el acta de ceremonias del sprint Generaré el sprint report	Poca experticia en desarrollo de esta documentación.	Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.

v. Día 5

Integrante	Rol	Qué hice ayer	Qué haré hoy	Obstáculos	Observaciones del Scrum Master
Andrés Santiago Gomez Rojas	Desarrollador	Validé el desarrollo del listado dinámico de eventos disponibles.	Validaré el programa completo.	Posibles conflictos no esperados.	Ninguna.

Shirly Katherinn Leal Nieves	Desarrollador	Validé la implementación del sistema de registro de asistentes a eventos.	Validaré el programa completo.	Posibles conflictos no esperados.	Ninguna.
Brayan Espinosa Osorio	Desarrollador	Implementé el módulo de asignación de artistas a eventos	Validaré el programa completo.	Posibles conflictos no esperados.	Ninguna.
Luis Hernán González Ordoñez	Scrum Master	Generé de nuevo el repositorio por errores míos en la generación de las ramas y conflictos en los push de los desarrolladores.	Validaré el programa completo. Generaré el video demostrativo de la funcionalidad del programa.	Poca experticia en desarrollo de esta documentación.	Necesidad de aprendizaje sobre la marcha en el ejercicio del rol de scrum master.

vi. Resumen

Resumen Diario de Dailies – CultuVivo			
Día	Entradas registradas	Obstáculos reportados	Observaciones
Día 1	4	4	Error mío al no asignar tareas por espera de aprobación del Sprint backlog.
Día 2	4	4	El uso de un json compartido único generó retrasos en el desarrollo.
Día 3	4	4	Error mío en la generación del repositorio y sus ramas, creando conflictos en los push de los desarrolladores.
Día 4	4	4	Notable resolución en los conflictos del código por parte de los desarrolladores.
Día 5	4	4	Ninguna.
TOTAL	20	20	

d. Reunión finales

i. Sprint Review

Aspecto Evaluado	Descripción / Resultados del Sprint Review
Duración del Sprint	22 al 27 de octubre de 2025 (5 días)
Equipo de trabajo	Scrum Master: Luis Hernán González Ordoñez Product Owner: Carlos Rueda Desarrolladores: Brayan Espinosa Osorio, Shirley Katherinn Leal Nieves, Andrés Santiago Gómez Rojas
Objetivo del Sprint	Entregar un MVP funcional que permitiera gestionar eventos culturales, incluyendo creación y administración de eventos, registro de artistas y asistentes, asignación de artistas a eventos y control de capacidad, garantizando acceso por roles.

Historias de usuario incluidas	HU-01 (Crear, editar y eliminar eventos) HU-02 (Asignar artistas a eventos) HU-04 (Ver lista de eventos disponibles) HU-05 (Registrar asistentes a eventos) HU-08 (Registrar y administrar artistas)
Cumplimiento de historias	HU-01: Cumplida — el sistema permite crear, editar y eliminar eventos con datos completos y persistencia en JSON. HU-02: Cumplida — se implementó la asignación de artistas a eventos, vinculando presentación y duración. HU-04: Cumplida — se genera listado dinámico de eventos disponibles con control de aforo. HU-05: Cumplida — se desarrolló el registro de asistentes con validación de cupos. HU-08: Cumplida — CRUD completo de artistas operativo.
Evaluación del código entregado	El código está organizado en módulos funcionales (eventos, artistas, asistentes), con persistencia mediante archivos JSON. Se observa correcta relación entre las entidades y menús interactivos que permiten ejecutar las funciones principales. La lógica cumple los requerimientos del MVP, aunque se recomienda incorporar validaciones adicionales de entrada y manejo de excepciones para robustecer el sistema.
Resultados obtenidos	Se logró un MVP estable que cumple con los objetivos del Sprint 1. Las funcionalidades centrales fueron implementadas y probadas. La integración entre módulos se completó con éxito luego de resolver conflictos de repositorio.
Demostración del producto	Durante la reunión de revisión se presentó el funcionamiento del sistema CultuVivo, mostrando: creación de eventos, registro y asignación de artistas, registro de asistentes, control de aforo y visualización de eventos disponibles.
Retroalimentación del Product Owner	El PO valoró positivamente la funcionalidad y facilidad de uso del sistema. Solicitó para el siguiente sprint mejorar la interfaz de usuario, optimizar el control de errores y generar reportes estadísticos automáticos.
Conclusiones generales	El Sprint 1 se considera exitoso. Se cumplieron los objetivos planteados y se entregó un producto funcional y demostrable. Se evidenció buena colaboración entre los miembros del equipo, aunque se recomienda fortalecer la planificación inicial y las pruebas integradas para reducir los conflictos de repositorio.
Lecciones aprendidas	- La definición temprana de la estructura del JSON evita conflictos durante el desarrollo. - Es clave validar dependencias entre HU antes de iniciar el Sprint. - Mantener un control de versiones organizado es esencial para la integración final. - Documentar diariamente permitió resolver problemas a tiempo.

ii. Retrospectiva del sprint

Aspecto Evaluado	Descripción / Resultados del Sprint Retrospective
------------------	---

Duración del Sprint	22 al 27 de octubre de 2025
Scrum Master	Luis Hernán González Ordoñez
Product Owner	Carlos Rueda
Equipo de Desarrollo	Brayan Espinosa Osorio, Shirly Katherinn Leal Nieves, Andrés Santiago Gómez Rojas
Objetivo del Sprint	Entregar un MVP funcional con las principales características del sistema CultuVivo: gestión de eventos, registro y asignación de artistas, registro de asistentes y visualización de eventos disponibles.
Lo que salió bien	- Se completaron todas las historias de usuario planificadas para el Sprint 1. - El equipo mantuvo comunicación constante durante los Daily Stand-up. - Se logró integrar los módulos principales (eventos, artistas y asistentes) sin errores críticos. - La documentación Scrum (actas, backlog, daily logs, riesgos) se mantuvo actualizada. - Buena disposición y colaboración entre los desarrolladores.
Lo que se puede mejorar	- Definir desde el inicio una estructura de archivos JSON única y validada por todo el equipo. - Planificar mejor la gestión del repositorio para evitar conflictos en los <i>push</i> y <i>merge</i>. - Incluir más validaciones de entrada y manejo de excepciones en el código. - Distribuir las tareas de manera más equilibrada para evitar sobrecarga en algunos miembros.
Problemas identificados	- Conflictos en el repositorio por errores de ramas y <i>push</i> simultáneos. - Dependencia entre módulos (HU-08 y HU-02) que retrasó parte del desarrollo. - Aprendizaje sobre la marcha en la documentación Scrum debido a poca experiencia inicial.
Acciones de mejora para el próximo Sprint	- Implementar control de versiones más estricto (uso de ramas por historia de usuario). - Asignar un responsable de validación de integración antes de cada <i>merge</i>. - Realizar revisión de código conjunta al cierre de cada día. - Capacitación rápida en manejo de Git y Scrum para el Scrum Master y los desarrolladores.
Nivel de satisfacción del equipo	8.5 / 10 — el equipo expresó satisfacción con los resultados, destacando el aprendizaje obtenido y la cooperación. Sin embargo, reconocen oportunidades de mejora en la gestión técnica del repositorio y la planificación inicial.
Compromisos para el siguiente Sprint	- Incorporar generación de reportes automáticos (asistencia y programación). - Mejorar la interfaz visual del sistema. - Incluir validaciones de datos y manejo de errores más robusto. - Documentar los cambios en tiempo real para evitar inconsistencias.
Conclusión general	El Sprint 1 fue exitoso en la entrega del MVP y fortaleció las habilidades colaborativas del equipo. Se consolidaron prácticas de trabajo ágil y se

	identificaron puntos clave para optimizar la calidad del código y la organización técnica en los próximos sprints.
--	--

iii. Velocidad del equipo:

1. Formula:

$\langle \text{funcionalidades realizadas} \rangle / \langle \text{total de funcionalidades} \rangle$

2. Datos del proyecto

En el **Sprint 1** se planificaron **5 historias de usuario (funcionalidades)**:

- HU-01 → Gestión de eventos
- HU-02 → Asignación de artistas
- HU-04 → Listado de eventos
- HU-05 → Registro de asistentes
- HU-08 → Gestión de artistas

De acuerdo con el **Sprint Review**, todas fueron **cumplidas satisfactoriamente**.

3. Calculo

$\text{Velocidad del equipo} = 5/5 = 1.0$

4. Resultado

Velocidad del equipo = 1.0 (100%)

El equipo completó todas las funcionalidades planificadas dentro del sprint, lo que indica un **cumplimiento total del alcance comprometido**.

iv. Efectividad de la estimación

1. Formula

$\langle \text{tiempo_real [hrs]} \rangle / \langle \text{tiempo_total_estimado [hrs]} \rangle$

2. Datos del proyecto

Según el **Sprint Planning**, el sprint duró **5 días** con una jornada promedio de **8 horas por día** para cada integrante.

El equipo estuvo compuesto por **4 desarrolladores activos**, lo que da una **estimación total** de:

$\text{Tiempo estimado} = 5 \text{ días} * 8 \text{ horas/día} * 3.5 \text{ desarrolladores} = 140 \text{ horas}$

En los registros del **Daily Stand-up** y el **Sprint Review**, se observan:

- Retrasos leves por conflictos en el repositorio.
- Avances constantes sin días de inactividad.
- Trabajo adicional de validación y reconstrucción del repositorio en los días 3 y 4.

Tomando esto en cuenta, se estima que el **tiempo real invertido** fue ligeramente superior, en torno al **110 % del estimado**:

Tiempo real $\approx$ 154 horas

3. Cálculo

Efectividad de la estimación = 154 hrs / 140 hrs = 1.1

4. Resultado

Efectividad de la estimación = 1.10 (110%)

El equipo necesitó un 10 % más de tiempo del planeado. Esto refleja una estimación cercana a la realidad, con un leve incremento por la curva de aprendizaje en Git y la integración del código.

4. Documentación del MPV del producto

a. Video presentación del funcionamiento del programa:

<https://youtu.be/C4lnOUXMuWE>
